





IZAZOVI U PROVEDBI EU PROJEKATA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije

Natalia Radovčić

Ured za koordinaciju, harmonizaciju i međunarodne poslove
4. travnja 2023.

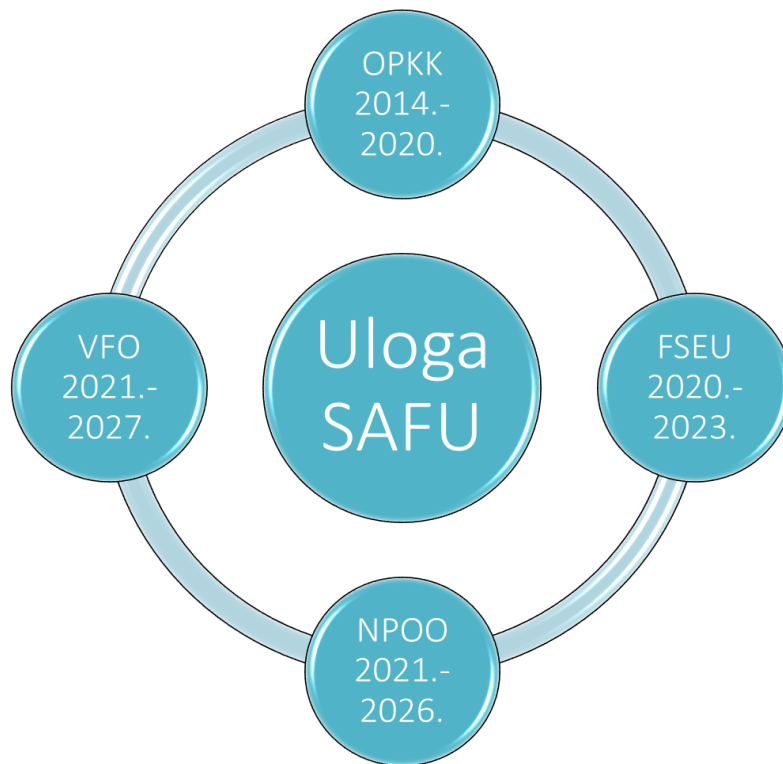


Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava


➤ SAFU je ugovorio više od 1.700 projekata:

- ukupna vrijednost tih projekata iznosi preko **47 mlrd. HRK/6,2 mlrd. EUR**
- dodijeljene su **37,7 milijarde HRK/5 mlrd. EUR bespovratnih sredstava**


Fond	Broj projekata
EFRR	1123
FSEU	240
KF	119
NPOO	258

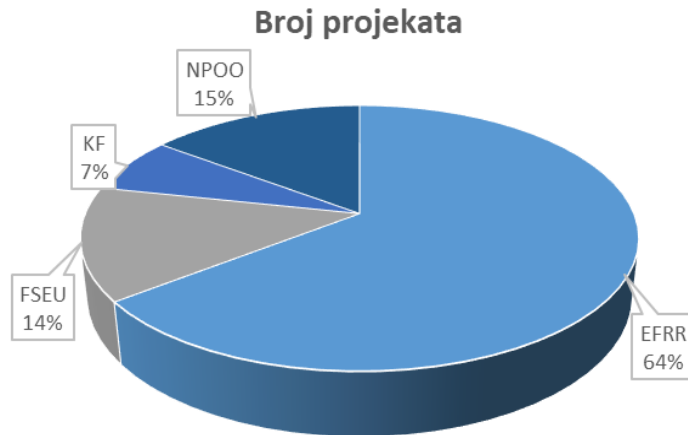


Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava OPKK, FSEU, NPOO



Status ugovora	Broj ugovora
Završeni	642
Raskinuti	48
U provedbi	1059
Ukupno	1749

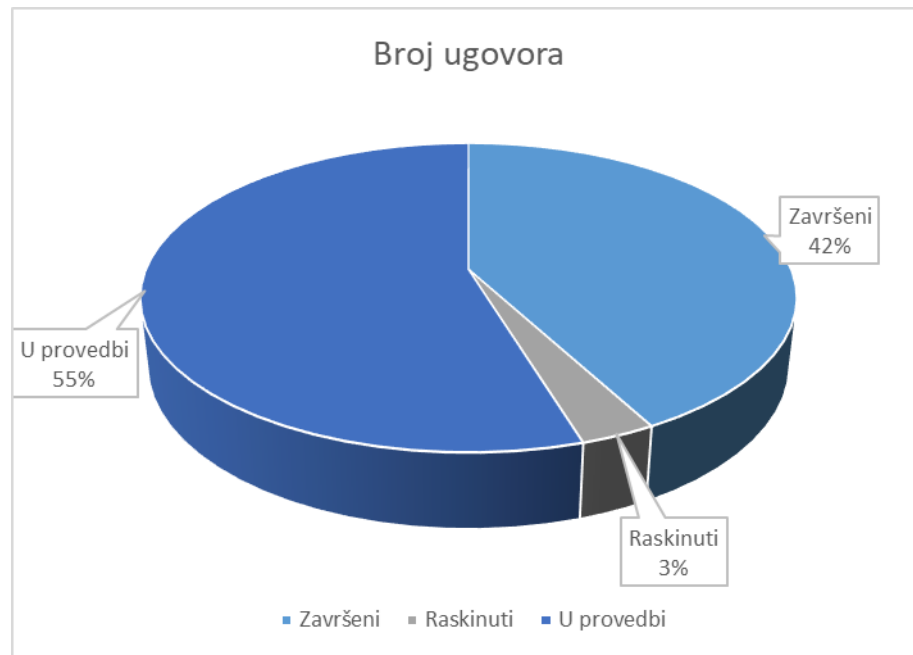

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.



- ugovoren **41 projekt** vrijedan gotovo **96 mil. eura** (64,4 mil. eura bespovratnih sredstava)

JAČANJE GOSPODARSTVA PRIMJENOM ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA

- izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje novih laboratorija te rekonstrukciju postojećih zgrada Hrvatskog šumarskog instituta
- **ukupna vrijednost ulaganja 393 tis. EUR**

KORIŠTENJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

- tri projekta namijenjena razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zagrebačke županije
- **ukupna vrijednost ulaganja gotovo 29 mil. EUR**



Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.

POSLOVNA KONKURENTNOST:

- Izgradnja i opremanje Poduzetničkog centra u Velikoj Gorici na dvije razine (31 ured, 24 radna mjesta u zajedničkom radnom prostoru, dvije manje dvorane za sastanke, velika modularna dvorana ukupnog kapaciteta 150 mjesta)
- Izgradnja modularnog drveno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu (sastoji se 8 prostornih jedinica prilagođeno proizvodnim pogonima, dok je njih 6 namijenjeno uredskom poslovanju stalnih korisnika inkubatora)
- Izgradnja prometnica u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom te u Poduzetničkoj zoni Rugvica
- prenamjena bivše vojarne Tabore u poduzetnički inkubator na području Samobora

– ukupna vrijednost svih ulaganja 15,7 mil. EUR



Prikaz buduće zgrade Poduzetničkog centra u Velikoj Gorici

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USLUGE: izgradnja i opremanje Doma za odrasle osobe Skupnjak i Centra za pružanje socijalnih usluga u Vrbovcu; rekonstrukcija infrastrukturnih jedinica za smještaj odraslih osoba s poremećajem iz spektra autizma; izgradnja multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom na području Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica; – **ukupna vrijednost svih ulaganja 12,2 mil. EUR**



Nova zgrada Centra za pružanje socijalnih usluga u Vrbovcu



Prikaz planirane zgrade Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.

OBNOVA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE:

- Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom
- revitalizacija brownfield lokacije nekadašnje zgrade Doma zdravlja u Dugom Selu u novi Kulturni centar za posjetitelje
- izgradnja Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja na tri etaže - stvorit će se dugoročno rješenje za deponiranje dijela muzejskog fundusa, kreirat će se prostor za prezentaciju nematerijalne kulturne baštine uz pomoć digitalnih medija te će se stvoriti prostor za učenje starih turopoljskih tehnika rada.
- izgradnja i opremanje Posjetiteljskog centra Sošice na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje
- obnova srednjovjekovne utvrde Zelingrad unutar koje se nalazi izložbeni muzejski prostor sa stalnim postavom i dio za povremene izložbe, multifunkcionalna dvorana za koncerte, predavanja, razna okupljanja i jednostavni ugostiteljski objekt

– ukupna vrijednost svih ulaganja 19,3 mil. EUR



Obnova Dvorca Erdödy u tijeku

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.

TEHNIČKA POMOĆ

- dva projekta Tehničke pomoći za Razvojnu agenciju Zagrebačke županije
- **ukupna vrijednost ulaganja 4 mil. EUR**

ZNANOST, OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

- Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu na tri lokacije - Velika Gorica, Dugo Selo i Samobor
- **ukupna vrijednost ulaganja 6,6 mil. EUR**



Na slici je prikaz buduće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru OPKK 2014.-2020.

PROMET: u okviru poziva „ITU - Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb” ugovoreno je 10 projekata izgradnje i modernizacije biciklističkih staza na području cijele županije **ukupne vrijednosti 8,8 mil. EUR**



Biciklistička staza u Općini Mariji Gorici



Prikaz dionice biciklističke staze između naselja Strmec, Orešje, Bestovje ukupne duljine 3.360 metara

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru NPOO 2021.-2026.

- U okviru poziva *“Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv”* financirat će se **izgradnja 25 vrtića vrijednih gotovo 19 mil. eura** među kojima su:
 - Izgradnja dječjih vrtića Kolareva i Kurilovec u Velikoj Gorici
 - Dogradnja i opremanje objekta Dječjeg vrtića Videk u Brdovcu
 - Rekonstrukcija društvenog doma Luka, prenamjena u područni vrtić dječjeg vrtića u gradu Vrbovcu
 - Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina
 - Izgradnja dječjeg vrtića u Ivanić Gradu (na slici)



Plan dječjeg vrtića u Ivanić Gradu

Zagrebačka županija – pregled ulaganja u okviru FSEU

Ugovoreno je **10 projekata vrijednih 587,4 tis. eura**:

- Sanacija oštećenja od potresa na Područnim školama u Donjoj Kupčini i Bratini, Srednjoj školi Jastrebarsko i Osnovnoj školi Đure Deželića
- Uklanjanje zgrade Područne škole Gornji Hruševac
- Sanacija oštećenja od potresa na školskoj dvorani Osnovne škole Pokupsko
- Vraćanje u uporabljivo stanje bolničke zgrade Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra
- Rekonstrukcija stropa blagovaone oštećenog uslijed potresa u OŠ Ivana Brlić Mažuranić



Oštećena zgrada škole Gornji Hruševac

Obveze korisnika i Posredničkih tijela



Provedba projekata – kako se pripremiti

- Unaprijed se upoznati sa svim odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
- Oformiti provedbeni tim
- Osigurati novčani tijek za projektne troškove (uključujući i eventualne neprihvatljive troškove)
- **Potpisom ugovora korisnik preuzima odgovornost za uspješnu provedbu svog projekta te započinje nadzor provedbe projekata od strane PT2**
- Pravovremeno započeti s provedbom aktivnosti

*** **SAFU** svakom projektu dodjeljuje osobu koja prati provedbu projekta i pomaže korisniku

Provedba projekata – zadaci i izazovi

Obveze korisnika:

na početku provedbe projekta dostavlja:

- Plan aktivnosti
- Plan nabave
- Plan dostave ZNS-ova i trošenja sredstava
- Zahtjev za isplatom predujma (ukoliko mu je isti odobren i želi ga potraživati)

tijekom provedbe projekta dostavlja:

- Zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) SAFU
- obavještava SAFU o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na valjanu provedbu projekta bez kašnjenja

ZAHTJEV ZA NADOKNADU SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

Datum		Broj		Datum ispravka	
Naziv projekta					
Šifra projekta					
Naziv Korisnika					
OIB					
Vrsta pravnog subjekta					
Obveznik PDV-a					
Izveštajno razdoblje	Od		Do		
Vrsta zahtjeva					

Provedba projekata – zadaci i izazovi

Obveze korisnika:

- osigurava provođenje svih radova (*ukoliko ih ima*) i ostalih aktivnosti u skladu s početnim planovima i ugovorom
- osigurava da partner poštuje sve ugovorne obveze
- pravovremeno dostavlja svu dokumentaciju u SAFU na pregled
- sistematizirano pohranjuje dokumentaciju projekta čime osigurava revizijski trag



Provedba projekata – zadaci i izazovi

- **SAFU** prilikom pregleda izvještaja i odobrenja ZNS-a provodi:
 - **verifikaciju prijavljenih troškova i obradu ZNS-a** za isplatu
 - ex-post kontrole dokumentacije i postupaka nabave
 - provjere na licu mjesta:
 - minimalno jednom tijekom perioda provedbe projekta, ovisno o kompleksnosti
 - uvid u stvarno stanje na terenu
 - usporedba dostavljenih dokumenata/dokaza s izvornicima – dokumentacije o provedenim nabavama, računovodstvene evidencije, građevinske knjige, izvještaji s održanih edukacija, izrađeni outputi, osiguranje mjera vidljivosti projekta

Provedba projekata – zadaci i izazovi

➤ Provedba postupaka nabave

U prosjeku jedan projekt ima oko 20 nabava, međutim, ovisno o kompleksnosti, trajanju i ugovornom iznosu projekta to može varirati od par nabava do preko 100 nabava po projektu

➤ Korisnik

- pravovremeno priprema dokumentaciju za objavu nabave te provedbu postupka, sklapanje ugovora i provedbu ugovora o nabavi
- dostavlja Dokumentaciju o nabavi (DoN) na ex-ante kontrolu u SAFU

➤ SAFU

- u sklopu ex-ante provjere daje preporuke i savjete za prilagodbu dokumentacije o nabavi temeljem primjenjivog zakonodavstva (HR i EU), ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uputa Upravljačkog tijela, plana nabave, prakse javne nabave, nalaza revizora i sl.

Provedba projekata – zadaci i izazovi

Zašto slati dokumentaciju na ex-ante provjeru u SAFU:

- smanjenje mogućnosti ulaganja prigovora na DoN
- smanjenje vjerojatnosti nastanka poteškoća u pregledu i ocjeni ponuda
- osiguravanje poštivanja načela javne nabave
- u konačnici - manji broj nepravilnosti i posljedično korekcija prilikom ex-post verifikacije nabava
- usustavljivanje prakse postupanja
- smanjenje rizika naknadnog utvrđivanja nepravilnosti putem revizijskih nalaza



Provedba projekata – zadaci i izazovi

➤ Izmjene ugovora


- Prolongacija trajanja provedbe projekta ➡ datak ugovoru o bespovratnim sredstvima
 - Razlozi za produljenje: produljenje trajanja radova (najčešće) i isporuka opreme/usluge koje slijede nakon radova te produljenje trajanja postupaka javne nabave uslijed žalbi i/ili ponavljanja postupka
- Izmjene u proračunu nastavno na provedene postupke nabava – odstupanja u budžetnim stavkama
- Izmjene aktivnosti
- Izmjene suradnika na projektu
- Dodaci ugovorima za radove (VTR, dodatni radovi)

Najčešće vrste nepravilnosti – SAFU iskustvo

- Umjetna podjela ugovora o radovima / uslugama / nabavi robe
- Restriktivne tehničke specifikacije, restriktivni uvjeti sposobnosti
- Kod infrastrukturnih projekata, propisivanje diskriminatorskih uvjeta sposobnosti
- Nezakoniti i/ili diskriminacijski kriteriji za odabir ponude utvrđeni u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje
- Nedostatak transparentnosti i/ili jednakog postupanja tijekom evaluacije, tj. ocjene ponuda
- U postupku pregleda i ocjene ponuda odabrana ponuda ponuditelja koja ne odgovara zahtjevima Dokumentacije o nabavi
- Izmjene ugovora o javnoj nabavi kojim se mijenjaju početni uvjeti nadmetanja

Prevenција nepravilnosti i uspješno provođenje projekta

- Ulaganje u kvalitetne i stručne ljudske kapacitete za pripremu i provedbu projekata, uključujući provedbu javne nabave
- Dobra dvosmjerna komunikacija korisnika i SAFU
- Dostava Dokumentacije o nabavi (DoN) na ex-ante kontrolu u SAFU
- Pohađanje edukacija koje SAFU organizira za sve svoje korisnike
- SAFU objavljuje upute za korisnike na svojoj mrežnoj stranici www.safu.hr

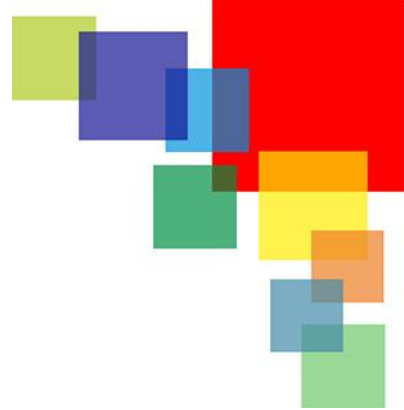

Zahvaljujem na pažnji!

Natalia Radovčić

SAFU
